現状

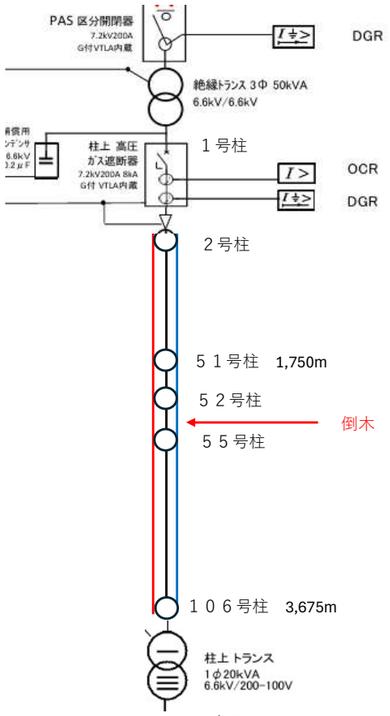

トランス

S － T 相接続

送電失敗⇒第２柱Ｇ付ＰＡＳ動作（GR表示）
⇒Ｉｏ整定を０．３Ａにしたら消灯し、送電できた

仮送電１

6月28日

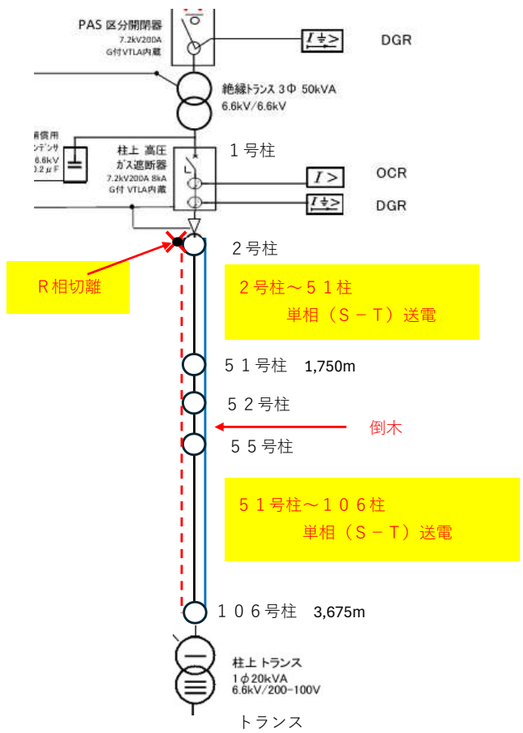

トランス

S － T 相接続

仮送電１
・２号柱のＲ相切離
・２号柱～５１号柱⇒単相送電(S相-T相)
・５２号柱～１０６号柱⇒単相送電⇒トランスまで送電

送電失敗⇒第２柱Ｇ付ＰＡＳ動作（GR表示）
⇒Ｉｏ整定を０．３Ａにしたら消灯し、送電できた

仮送電２

7月13日

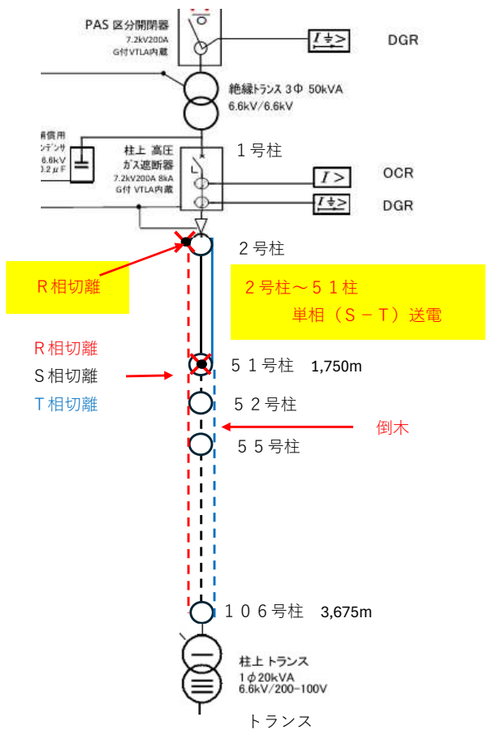

トランス

S － T 相接続

仮送電２
・２号柱のＲ相切離
・５２号柱のＲ・Ｓ・Ｔ相切離
・２号柱～５１号柱⇒単相送電(S相-T相)
・５２号柱～１０６号柱⇒未送電

仮送電3

7月22日
予定

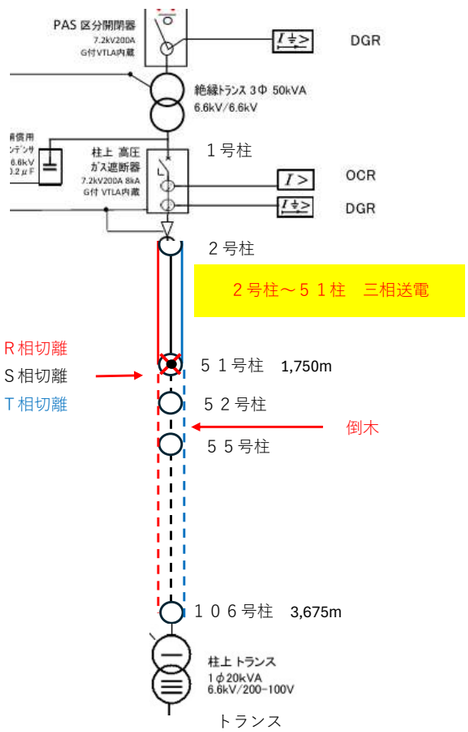

トランス

S － T 相接続

仮送電３　7月２２日実施予定
・２号柱～５１号柱⇒３相送電
・５２号柱～１０６号柱⇒未送電
